

Ontwerp Locatieplan

Ondergrondse containers:

Oud Papier en Karton (OPK)

Glas

**Gemeente
Teylingen**

Inhoudsopgave

Locatie#	Fractie	Straat	Pagina
1	Papier	Van Limburg Stirumstraat	5
2	Papier	Burg. Ketelaarstraat	6
3	Papier	Marijkestraat	7
4	Papier	Roodemolenweg	8
5	Papier	Van Alkemadelaan	9
6	Papier	Geelhoornstraat	10
7	Papier	Ter Leedelaan	11
8	Papier	B.G.J. Berntzenstraat	12
9	Papier	Sportlaan	13
10	Papier	Dinsdagse Wetering	14
11	Papier	Boekenburglaan	15
12	Papier	Bloemenschans/Waterlelieweg	16
13	Papier	Kruidenschans/Saffraanweg	17
14	Papier	Snoeklaan nr. 114	18
15	Papier	Baarslaan nr. 2	19
16	Papier	Bonekruidstraat nr. 13	20
17	Papier	Buxushaag	21
18	Papier	Hyacint nr. 91	22
19	Papier	Componistenlaan nr. 229	23
20	Papier	Keizerskroon	24
21	Papier	Mozartlaan nr. 34	25
22	Papier	Jacoba van Beierenweg "De Tulp"	26
23	Papier	Parkhove	27

Locatie#	Fractie	Straat	Pagina
1	Glas	Vivaldipark	29
2	Glas	Jacoba van Beierenweg "De Tulp"	30
3	Glas	Jacoba van Beierenweg "De Tulp"	30
4	Glas	Van Alkemadelaan	31
5	Glas	Boekenburglaan	32
6	Glas	Marijkestraat	33
Locatie#	Fractie	Straat	Pagina
1	Rest	Papendrechtlaan	34



Legenda



Gas



Electriciteit



Data-transport



Waterleidingen



Riolering

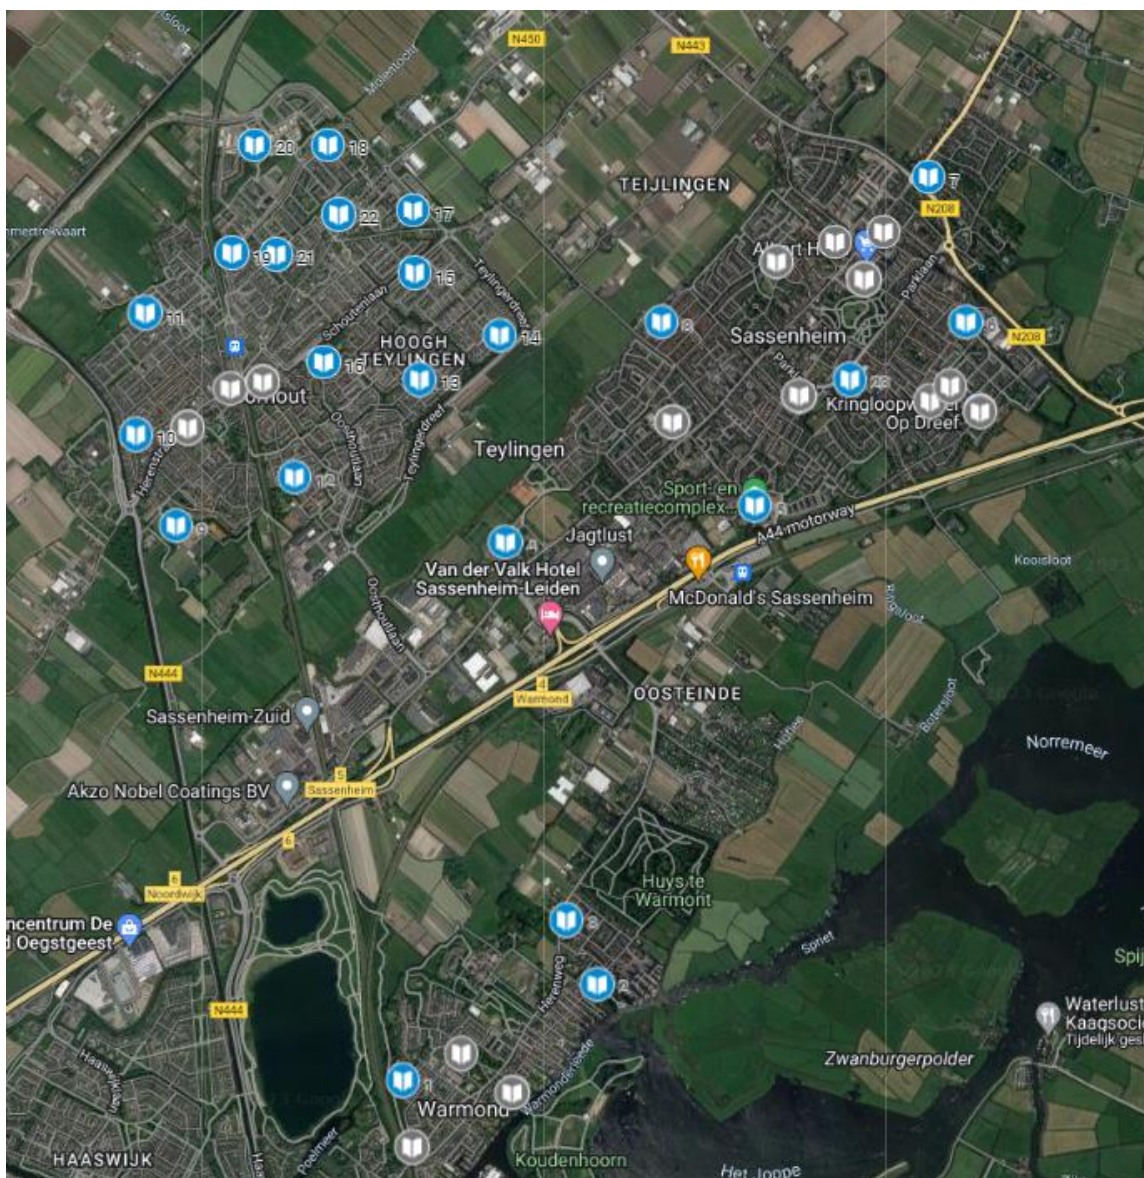


Fase 1


Oud papier en karton

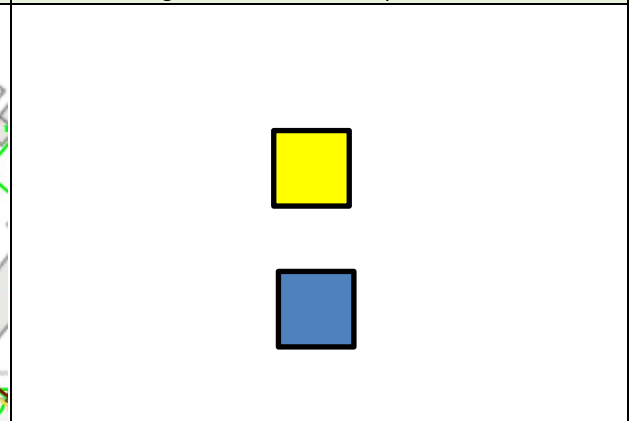
Legenda:

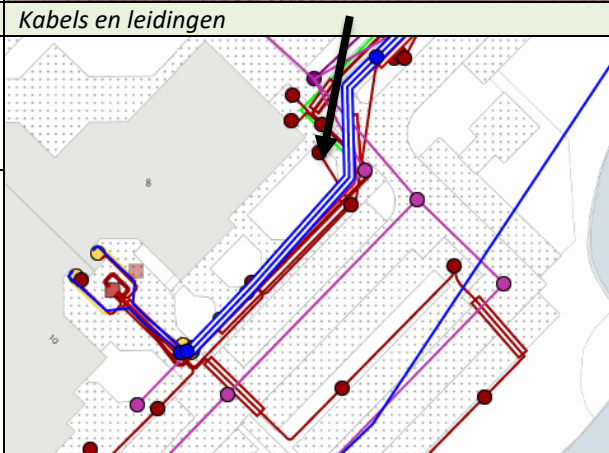
-  Bestaande papiercontainers
-  Nieuwe papiercontainers

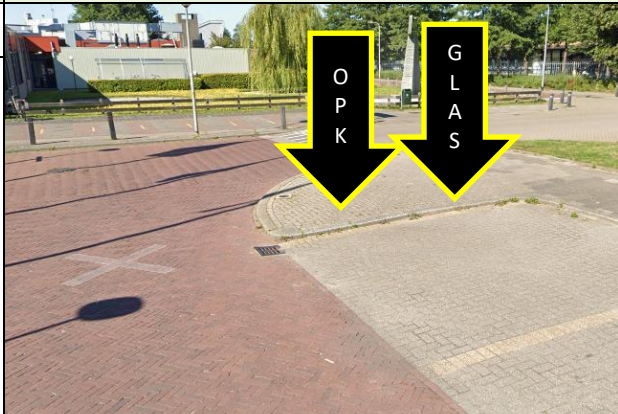
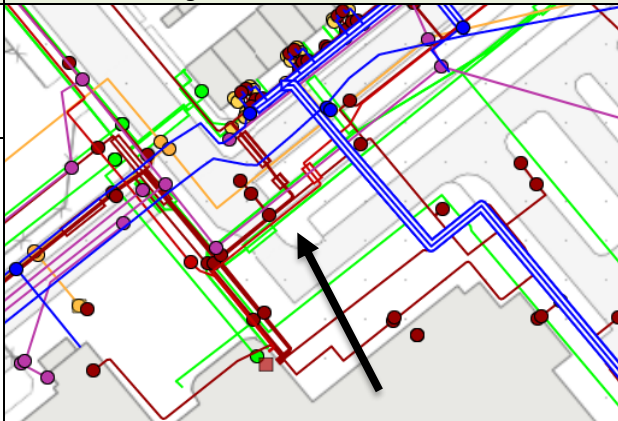
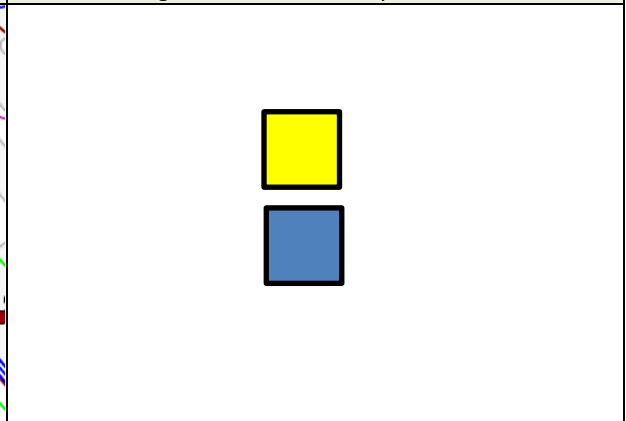


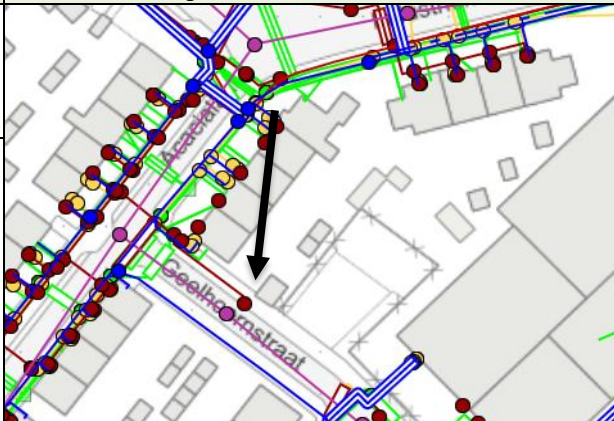
5

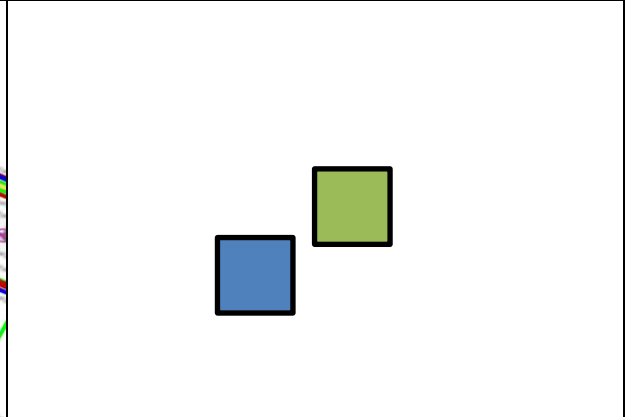
Containernummer:		2	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Warmond		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Burgemeester Keterlaarstraat			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing in het trottoir naast parkeerstrook.			
Klic:	Kabels en leidingen		Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Let op! Op locatie liggen veel kabels en leidingen. Check door middel van een proefsleuf is noodzakelijk.			
Opmerkingen:			
Afweging om de huidige glascontainers wat op te schuiven richting parkeervak. Hiermee de minder kwalitatief goede betonput te vervangen en meer ruimte te krijgen voor de nieuwe papiercontainer. Daarbij meteen het straatwerk op locatie vernieuwen.			

Containernummer:		3	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Warmond		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Marijkestraat			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing in de groenstrook, naast het trottoir.			
Hierbij voldoende afstand houden van de boomkroon.			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Let op! Gasleiding nabij.			
Opmerkingen:			
Voorafgaand aan plaatsing is het graven van een proefsleuf aan te raden.			

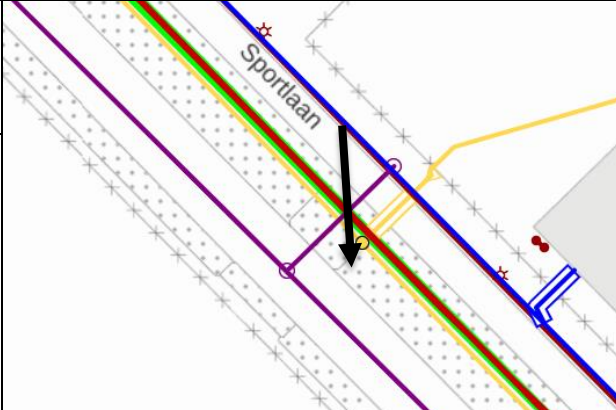
Containernummer:		4	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Rodemolenweg			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing in de groenstrook aan de zijkant van de parkeerplaats. Betreft een opstelplaats voor huidige rolcontainers.			
Klic:	Kabels en leidingen		Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Bij plaatsing in het groen rekening houden met de electra aansluiting van de lichtmast			
Opmerkingen:			

Containernummer:		5	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: van Alkemadelaan / Sportdreef			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing van de container in het verbrede trottoir op de kop van de parkeervakken. Plaatsing hierbij zoveel mogelijk naar de wegkant.			
Klic:	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie	
Geen belemmerende kabels en leiding in beeld.			
Opmerkingen:			
Op locatie wordt tevens een glascontainer (fase 1) bijgeplaatst. Deze wordt naast de beoogde papiercontainer geplaatst.			

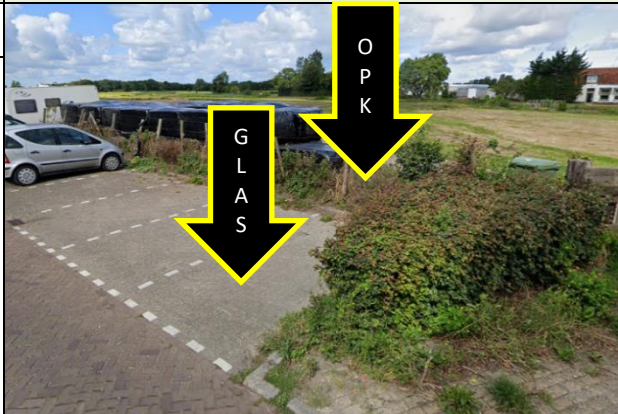
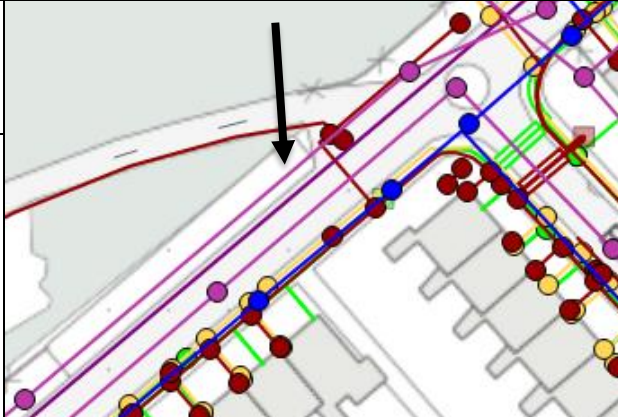
Containernummer:		6	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Geelhoornstraat			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing naast bestaande voorzieningen voor GFT en restafval. In lijn, in het groen direct aan het trottoir.			
Klic:	Kabels en leidingen		Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Aandacht voor electrakabel ter plaatse. Lijkt geen invloed te hebben op de plaatsingsmogelijkheden			
Opmerkingen:			
Zorgen voor voldoende afstand tot de bestaande voorzieningen op locatie.			

Containernummer:		7	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Ter Leedelaan			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing naast bestaande voorziening voor GFT.			
Klic:	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie	
Veel kabels en leidingen ter plaatse. Plaatsing is mogelijk, schuin achter bestaande voorziening.			
Opmerkingen:			
Betreft noodzaak voor een proefsleuf om exacte ligging kabels en leidingen te bepalen. Mogelijk blijkt de locatie bij nader onderzoek niet mogelijk.			
In deze wijk zijn de mogelijkheden echter sterk beperkt.			

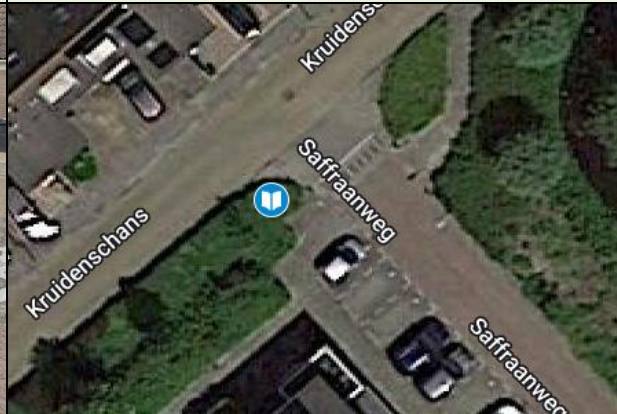
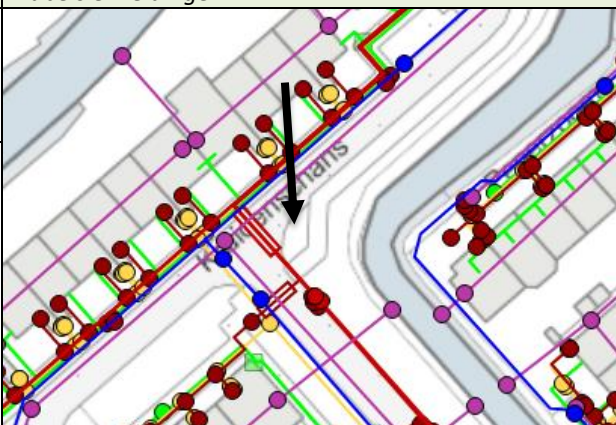
Containernummer:		8	OPK: 10/49
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Vooruitgangdreef / B.G.J. Berntzenlaan Plaatsing fase 1 Betreft: <i>Plaatsing in het trottoir aan de kop van de parkeerstrook.</i>			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Geen belemmerende kabels en leidingen in beeld			NVT
Opmerkingen:			

Containernummer:		9	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Sportlaan			
Betreft: <i>Plaatsing naast het brede trottoir dat toegang geeft tot de school en de scouting. Hierbij gaat één parkeervak weg om ruimte te maken voor de containers.</i>			
Klic:	Op locatie ligt de gasleiding 3 meter van de straat af. Bij plaatsing zal het dus niet mogelijk blijken om de beide containers achter elkaar te plaatsen. Afweging om aan de overzijde te plaatsen	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: <i>Het reeds aanwezige brede trottoir dient bereikbaar te blijven voor de calamiteitendienst, waardoor plaatsing van de containers daar niet mogelijk is. Dit kan wel goed functioneren voor inwoners die grondstoffen aan willen bieden.</i> <i>Op locatie wordt ook een glascontainer (fase 1) geplaatst.</i>			NVT

Containernummer:		10	
		<i>Locatiefoto</i>	<i>Plattegrond</i>
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Dinsdagse Wetering Betreft: <i>Plaatsing in het brede trottoir, naast de parkeerstrook. Let op vrije hoogte in verband met aanwezige boomkroon</i>			
Klic:	<i>Let op! Ruimte is beperkt. Containerplaatsing lijkt mogelijk, mits direct aan de straat in lijn met parkeervak.</i>	<i>Kabels en leidingen</i>	<i>Samenstelling inzamelmiddelen op locatie</i>
Opmerkingen: <i>Deze locatie is niet ideaal in verband met kabels en leidingen en plaatsing in de woonwijk. Er zijn echter geen alternatieven in de nabijheid voorhanden. Met het oog op spreiding over wijken is deze locatie toch opgenomen in het locatieplan.</i>			NVT

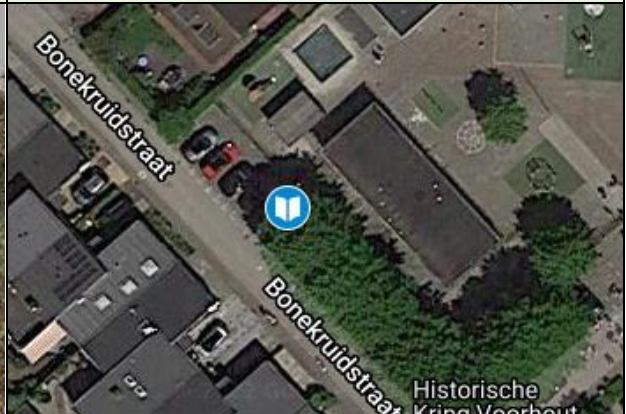
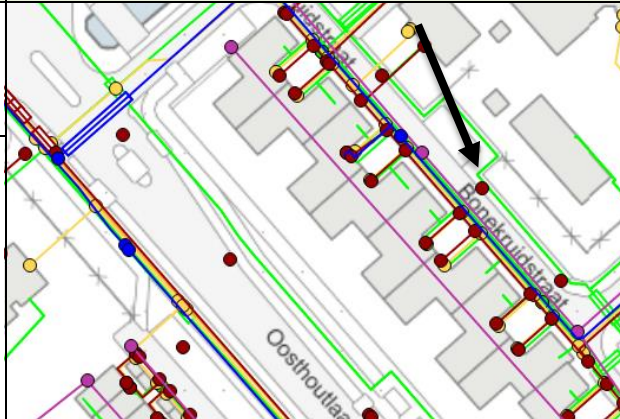
Containernummer:		11	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
<i>Korte locatieomschrijving:</i> Plaatsing fase 1 Locatie: Boekenburglaan Betreft: <i>Plaatsing in het laatste parkeervak. Parkeervak opheffen en gehele plek voorzien van verhoogd trottoir.</i>			
<i>Klic:</i> <i>Let op! Afstand tot electra en riolering beperkt. Exacte plaatsing vergt proefsleuf voorafgaand aan de werkzaamheden</i>			
<i>Opmerkingen:</i> Hier wordt tevens een Glascontainer geplaatst.			

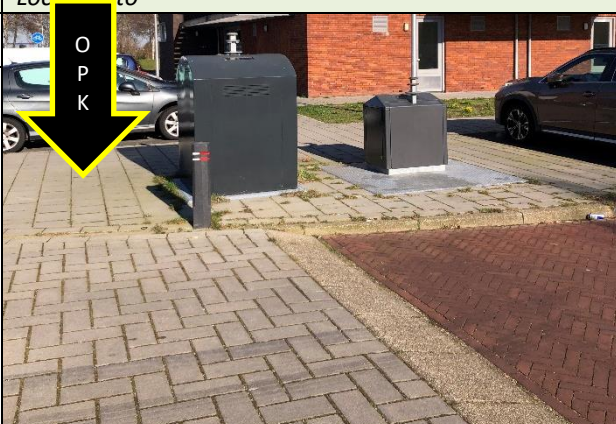
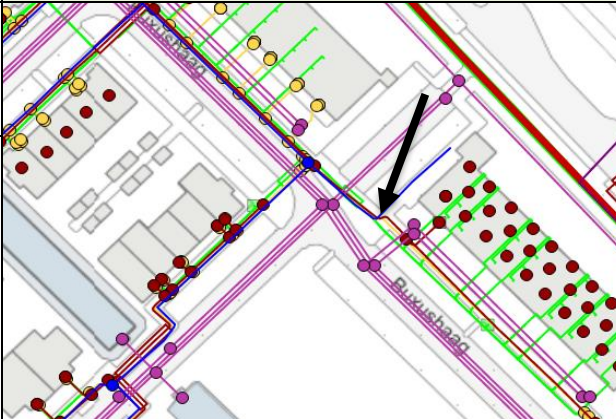
NVT

Containernummer:		13	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
<i>Korte locatieomschrijving:</i> Plaatsing fase 1 Locatie: Kruidenschans / hoek Saffraanweg Betreft: <i>Plaatsing in kleine groenstrook naast trottoir.</i>			
Klic:			
		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
<i>Geen belemmerende kabels en leidingen</i>			NVT
<i>Opmerkingen:</i> <i>Goed om rondom de locatie paaltjes te plaatsen om te voorkomen dat automobilisten de bocht afsnijden en de container beschadigen.</i>			

Containernummer:		14	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1			
Locatie: Snoeklaan tegenover huisnummer 114			
Betreft:			
Plaatsing in een verhoogd trottoir tussen de parkeervakken op locatie.			
Klic:	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie	
Geen belemmerende kabels en leidingen			NVT
Opmerkingen:			
Op locatie staat een jonge boom. Mogelijkheid om deze te verplaatsen naar een van de andere bestratingslocaties? Bijvoorbeeld op de hoek. Daarmee groenbehoud.			

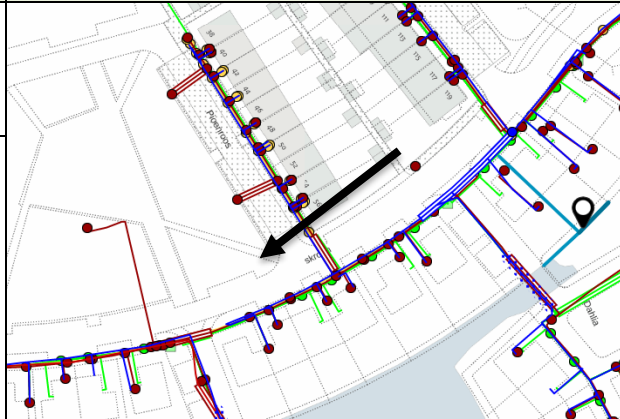
Containernummer:		15	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1 Locatie: Baarslaan t.h.v. nr. 2 Betreft: <i>Plaatsing in het groen nabij de hoek van de straat.</i>			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Geen belemmerende kabels en leidingen			NVT
Opmerkingen:			

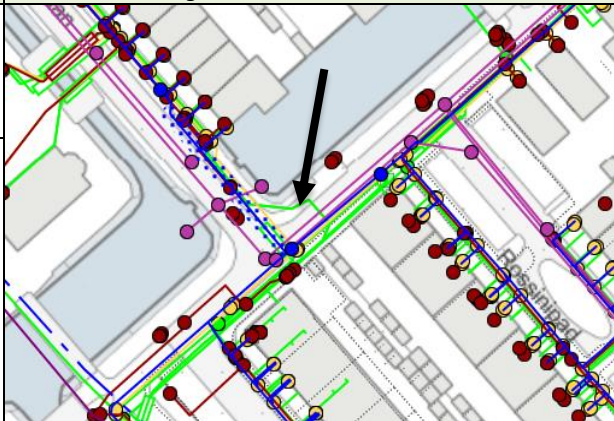
Containernummer:		16	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1 Locatie: Bonekruidstraat bij school nr. 13 Betreft: <i>Plaatsing in het brede trottoir nabij de school. Deels in het groen, deel in het trottoir. Hierbij rekening houden met de boomkronen op locatie.</i>			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Geen belemmerende kabels en leidingen			NVT
Opmerkingen: <i>Vaste ledigingstijden afstemmen met de inzamelaar, die niet conflicteren met de openingstijden van de school op locatie.</i> <i>Hiermee worden onveilige verkeerssituaties voorkomen.</i>			

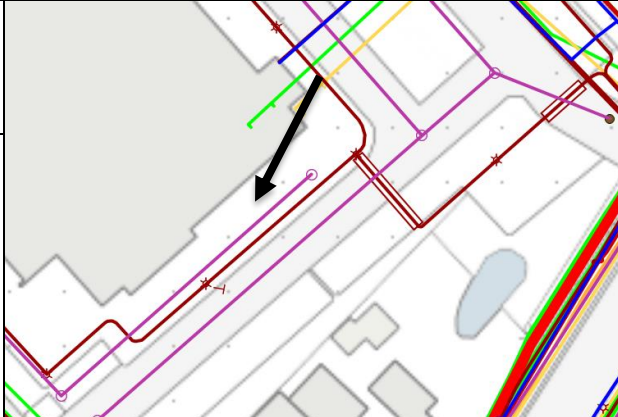
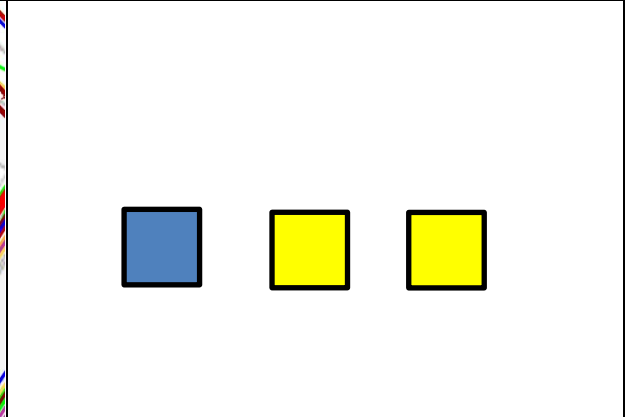
Containernummer:		17	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1			
Locatie: Buxushaag			
Betreft:			
Plaatsing in hoek van het trottoir naast parkeervakken naast bestaande voorzieningen GFT en restafval			
Klic:	Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie	
Geen belemmerende kabels en leidingen			NVT
Opmerkingen:			

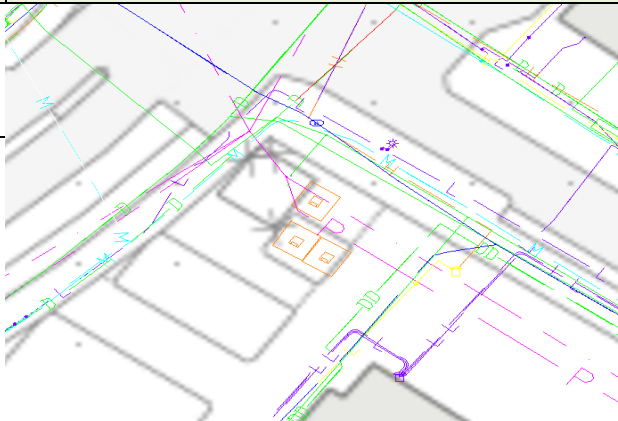
Containernummer:		18	
		<i>Locatiefoto</i>	<i>Plattegrond</i>
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1			
Locatie: Hyacint t.h.v. nr. 91			
Betreft: <i>Plaatsing in het brede trottoir op locatie, inwerpopening gericht naar het overige trottoir</i>			
Klic:	<i>Kabels en leidingen</i>	<i>Samenstelling inzamelmiddelen op locatie</i>	
<i>Geen belemmerende kabels en leidingen</i>			NVT
Opmerkingen:			

Containernummer:		19	
		<i>Locatiefoto</i>	<i>Plattegrond</i>
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Componistenlaan t.h.v. nr. 229 Betreft: <i>Plaatsing in een verbreed trottoir op locatie</i>			
Klic:		<i>Kabels en leidingen</i>	<i>Samenstelling inzamelmiddelen op locatie</i>
Geen belemmerende kabels en leidingen			NVT
Opmerkingen:			

Containernummer:		20	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
<i>Korte locatieomschrijving:</i> Plaatsing fase 1 Locatie: Keizerskroon Betreft: <i>Plaatsing in de nieuwe woonwijk, op de hoek van de Pioenroos in het groen/trottoir.</i>			
Klic:			
<i>Geen belemmerende kabels en leidingen</i>		<i>Kabels en leidingen</i>	<i>Samenstelling inzamelmiddelen op locatie</i>
<i>Opmerkingen:</i> Controle op locatie bij plaatsing, afronding nieuwe wijk.			NVT

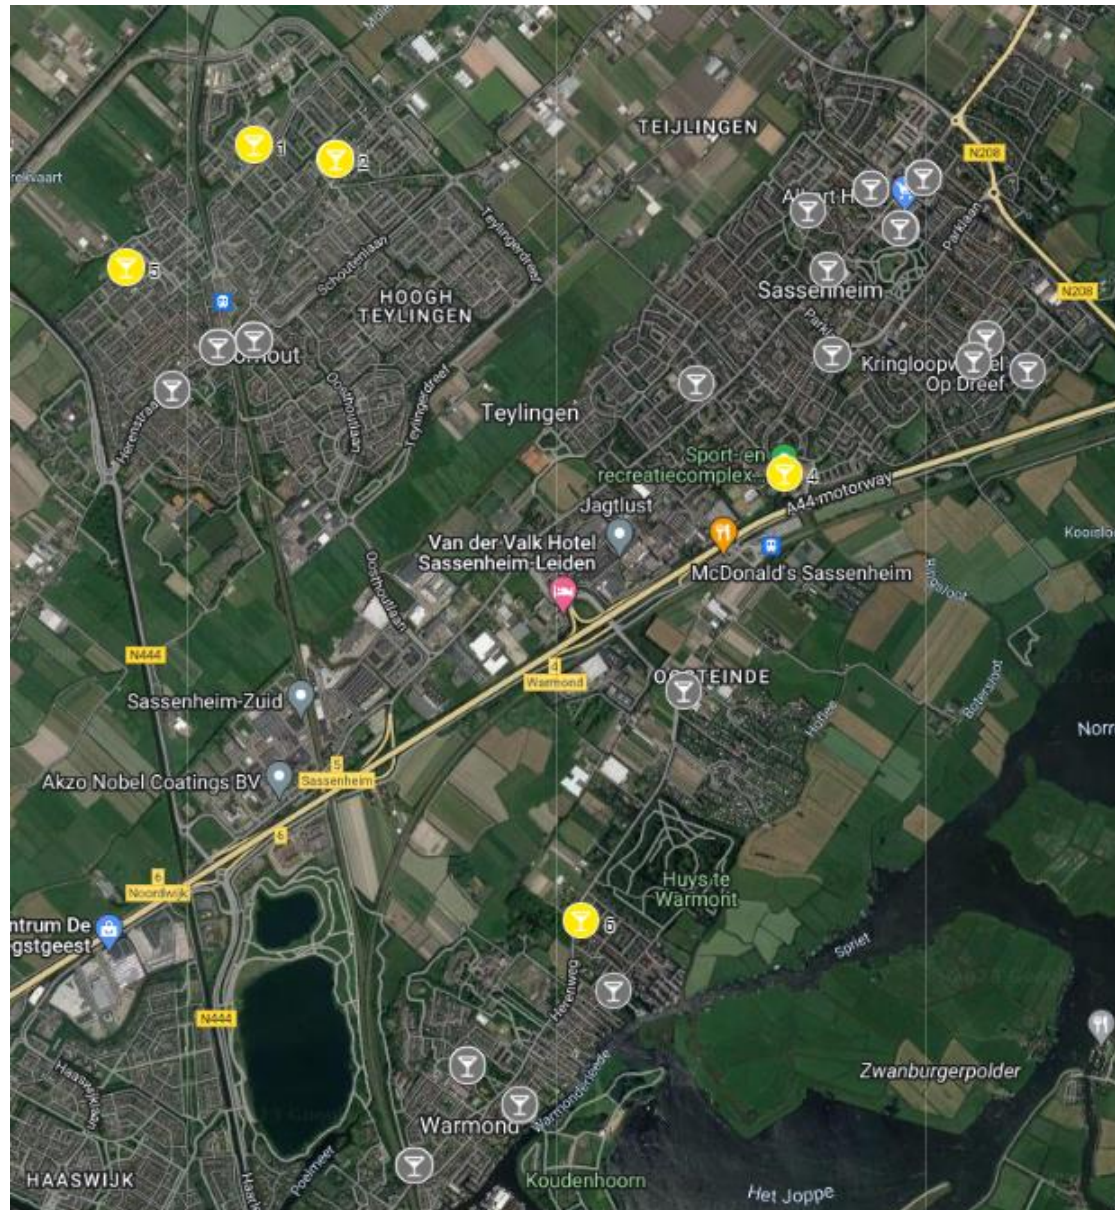
Containernummer:		21	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1			
Locatie: Mozartlaan tegenover nr. 34			
Betreft:			
Plaatsing naast bestaande containers voor restafval			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Mogelijk dient aanwezige datakabel wat verlegd te worden om de plaatsing mogelijk te maken.			
Opmerkingen:			
Alternatief is om de papiercontainer aan de andere zijde van de aanwezige restafvalvoorzieningen te plaatsen. Daarvoor zal dan de lichtmast verplaatst moeten worden.			

Containernummer:		22	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving: Plaatsing fase 1 Locatie: Jacoba van Beierenweg, naast sporthal "De Tulp" Betreft: <i>Plaatsing in het trottoir tussen de bomen op locatie</i>			
Klic:			
Geen belemmerende kabels en leidingen		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Opmerkingen: <i>Op locatie wordt ook voorzien in de plaatsing van twee glascontainers (fase 1).</i>			

Containernummer:		23		Plattegrond	
					
Wijk:	Sassenheim	Straat:	Parkhove		
Korte locatieomschrijving: Plaatsen van een een ondergrondse OPK container. Dit betreft plaatsing van een container op grond van VvE Parkhove.		Bedoeld voor: – Parkhove 101 t/m 807 (52)			
		Aantal aansluitingen: 52			
		Maximale loopafstand: 50 meter			
Klic:		Kabels en leidingen		Locatiefoto	
Let op: vrij verval leidingen in de buurt verlegging hiervan noodzakelijk!					
Opmerkingen: Inrit via Menneweg					

Fase 1

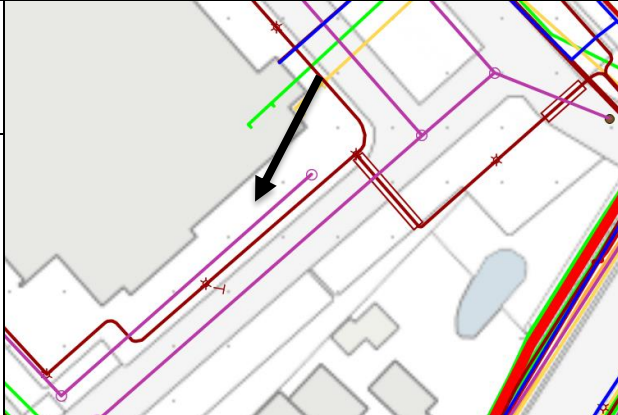

Glas

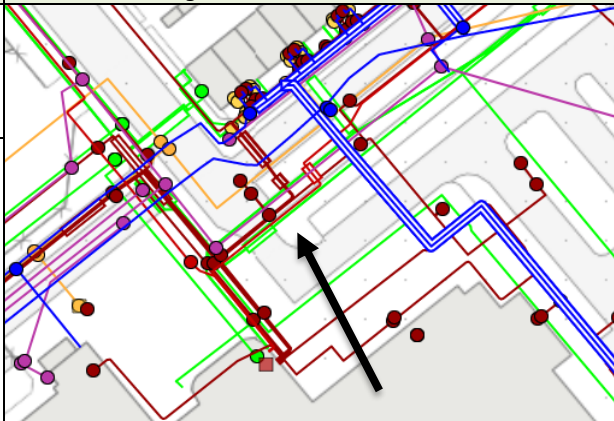
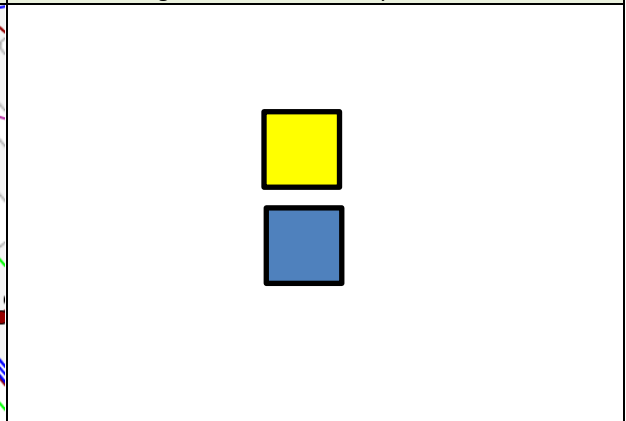


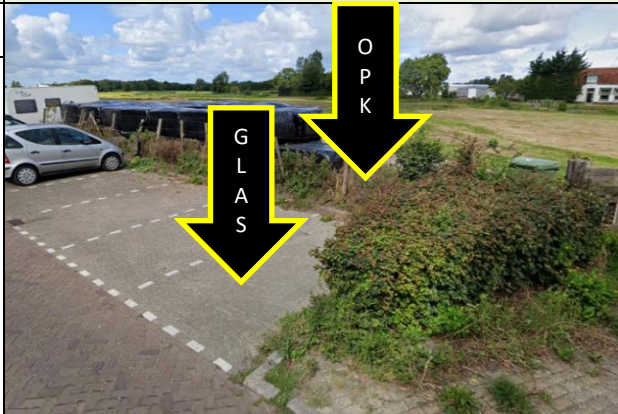
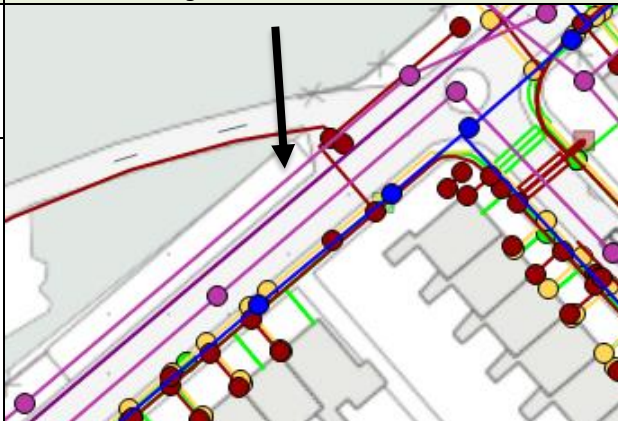

Legenda:

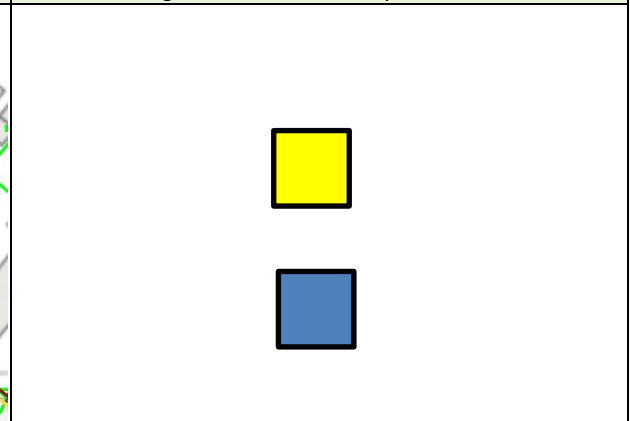
-  Bestaande Glascontainers
-  Nieuwe Glascontainers

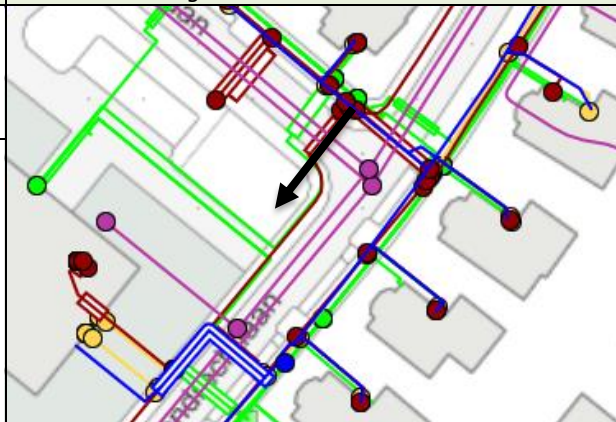
Containernummer:		1	
		<i>Locatiefoto</i>	<i>Plattegrond</i>
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1 Locatie: Strausspark Betreft: <i>Plaatsing in het verbrede trottoir, gelegen tussen de aanwezige parkeerplaatsen op locatie</i>			
Klic:		<i>Kabels en leidingen</i>	<i>Samenstelling inzamelmiddelen op locatie</i>
Klic melding nog niet beschikbaar			NVT
Opmerkingen:			

Containernummer:		2 + 3	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1 Locatie: Jacoba van Beierenweg, naast sporthal "De Tulp" Betreft: <i>Plaatsing in het trottoir tussen de bomen op locatie</i>			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Geen belemmerende kabels en leidingen			
Opmerkingen: Op locatie wordt ook een papiercontainer geplaatst.			

Containernummer:		4	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: van Alkemadelaan / Sportdreef			
Plaatsing fase 1			
Betreft:			
Plaatsing van de container in het verbrede trottoir op de kop van de parkeervakken. Plaatsing hierbij zoveel mogelijk naar de wegkant.			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Geen belemmerende kabels en leiding in beeld.			
Opmerkingen:			
Op locatie wordt tevens een papiercontainer geplaatst.			

Containernummer:		5	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Voorhout		
Korte locatieomschrijving:			
Plaatsing fase 1			
Locatie: Boekenburglaan			
Betreft:			
Plaatsing in het laatste parkeervak. Parkeervak opheffen en gehele plek voorzien van verhoogd trottoir.			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Let op! Afstand tot electra en riolering beperkt. Exacte plaatsing vergt proefsleuf voorafgaand aan de werkzaamheden			
Opmerkingen:			
Hier wordt tevens een papiercontainer geplaatst.			

Containernummer:		6	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Warmond		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Marijkestraat			
Plaatsing fase 1			
Betreft: <i>Plaatsing in de groenstrook, naast het trottoir. Hierbij voldoende afstand houden van de boomkroon.</i>			
Klic:		Kabels en leidingen	Samenstelling inzamelmiddelen op locatie
Let op! Gasleiding nabij.			
Opmerkingen:			
Voorafgaand aan plaatsing is het graven van een proefsleuf aan te raden.			

Containernummer:		1	
		Locatiefoto	Plattegrond
Kern:	Sassenheim		
Korte locatieomschrijving:			
Locatie: Papendrechtlaan 14			
Betreft:			NVT
Plaatsing van een 1.500 liter exemplaar voor de fractie van restafval. Plaatsing tegen heg aan, met voldoende afstand tot de aanwezige boomkroon.			
Klic:			
Geen belemmerende kabels en leidingen			
Opmerkingen:			
