Loosterweg Voorhout
Gemeente Teylingen
Versluys Groep

Versluys & Zoon BV
Aannemers- en Wegenbouwbedrijf

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Loosterweg te Voorhout**	**30 dagen?**	**maa 11-5-20**	**vri 19-6-20**
2	Werktijden dag: 07:00 - 16:00			
3	Werktijden nacht 19:00 - 06:00			
4	**Voorbereidende werkzaamheden**	**5 dagen**	**maa 11-5-20**	**vri 15-5-20**
5	Uitzetwerk/ kanten borstelen	5 dagen	maa 11-5-20	vri 15-5-20
6	**Afsluitingen**	**25 dagen**	**maa 18-5-20**	**vri 19-6-20**
7	Dag Afsluiting N443/Berg en Daal bewoners/bedrijven	1 dag	maa 18-5-20	maa 18-5-20
8	Nacht afsluiting (19 nachten)	25 dagen	maa 18-5-20	vri 19-6-20
9	**Werkzaamheden**	**25 dagen?**	**maa 18-5-20**	**vri 19-6-20**
10	**Te verwijderen werkzaamheden**	**3 dagen**	**maa 18-5-20**	**woe 20-5-20**
11	Profielfrezen N443/Berg en Daal (07:00 - 16:00)	1 dag	maa 18-5-20	maa 18-5-20
12	Profielfrezen (1 nacht)	2 dagen	din 19-5-20	woe 20-5-20
13	Putten verwijderen/asfalt aanvullen (07:00 - 16:00)	1 dag	maa 18-5-20	maa 18-5-20
14	**Aantebrengen werkzaamheden**	**20 dagen?**	**maa 25-5-20**	**vri 19-6-20**
15	Mesh track aanbrengen (3 nachten)	4 dagen	maa 25-5-20	don 28-5-20
16	Tussenlaag aanbrengen (2 nachten)	3 dagen	woe 27-5-20	vri 29-5-20
17	Deklaag aanbrengen (2 nachten)	3 dagen	din 2-6-20	don 4-6-20
18	Putten in boren (07:00 - 16:00)	1 dag	maa 8-6-20	maa 8-6-20
19	Deklaag aanbrengen opritten (1 nacht)	2 dagen	don 4-6-20	vri 5-6-20
20	Grond aanvullen/berm afwerken (07:00 - 16:00)	3 dagen	maa 8-6-20	woe 10-6-20
21	Fietssuggestiestroken aanbrengen (9 nachten)	10 dagen	maa 8-6-20	vri 19-6-20
22	Belijning aanbrengen (2 nachten)	3 dagen	maa 8-6-20	woe 10-6-20
23	Deadline	1 dag	vri 19-6-20	vri 19-6-20

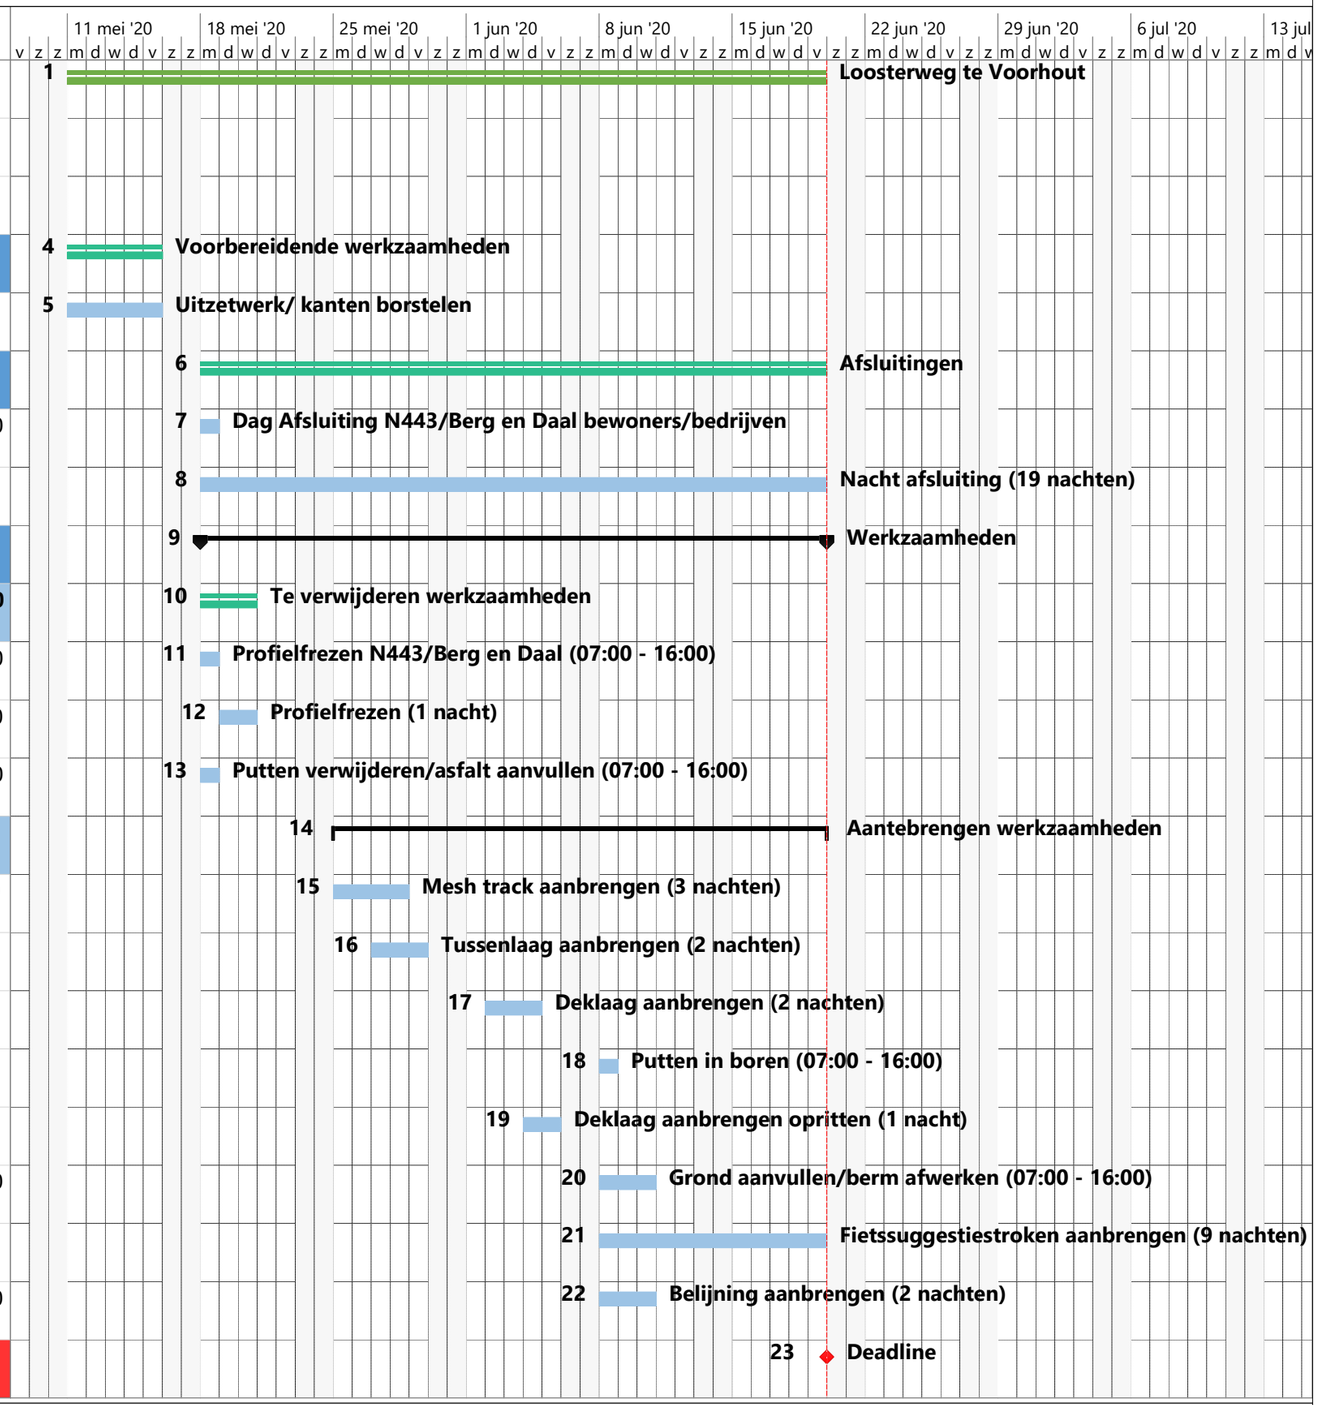

Datum: 13-02-2020
